Activity ID	Activity Description	Early Start	Early Finish	Budgeted Cost
1 LCLS PROJECT - PED & CONSTRUCTION				
1.06 X-RAY END STATION SYSTEMS				
1.06.01 System Management & Integration				
+ 1.06.01.01 Management				
		02/01/08A	07/29/09	155,803
1.06.04 XES Laser System				
+ 1.06.04.01 XES Laser				
		02/01/08A	03/20/09	820,269
+ 1.06.04.02 Laser Diagnostics				
		03/03/08	01/12/09	152,809
+ 1.06.04.03 Laser Optical Transport				
		03/03/08	02/20/09	564,146
+ 1.06.04.04 Laser Safety				
		02/11/08A	03/19/09	43,470
1.06.05 X-Ray Detectors				
+ 1.06.05.04 Detector & Streak Camera				
		02/01/08A	09/30/08	56,616
1.06.06 System Installation & Alignment				
+ 1.06.06.02 Near Hall Install				
		02/01/08A	07/31/08	49,996
1.06.07 AMOS Experiment				
+ 1.06.07.01 AMO Exp - Management & Design				
		02/01/08A	07/31/09	627,470
+ 1.06.07.02 AMO Exp - High Field Physics				
		04/16/08	11/11/09	2,229,095
+ 1.06.07.03 AMO Exp - Refocus Optics				
		04/01/08	07/17/09	539,869
+ 1.06.07.04 AMO Exp - Diagnostics				
		04/16/08	07/31/09	558,013
1.06.08 K Measurement Crystals				
+ 1.06.08.01 K Measurement Crystals				
		04/16/08	08/22/08	47,792
1.06.09 Mechanical Systems				
+ 1.06.09.01 PPS Stoppers				
		02/01/08A	05/28/09	507,479
+ 1.06.09.02 PPS Shielding				
		03/03/08	07/28/09	208,617
+ 1.06.09.03 NEH Hutch Doors				
		02/01/08A	07/31/08	99,767

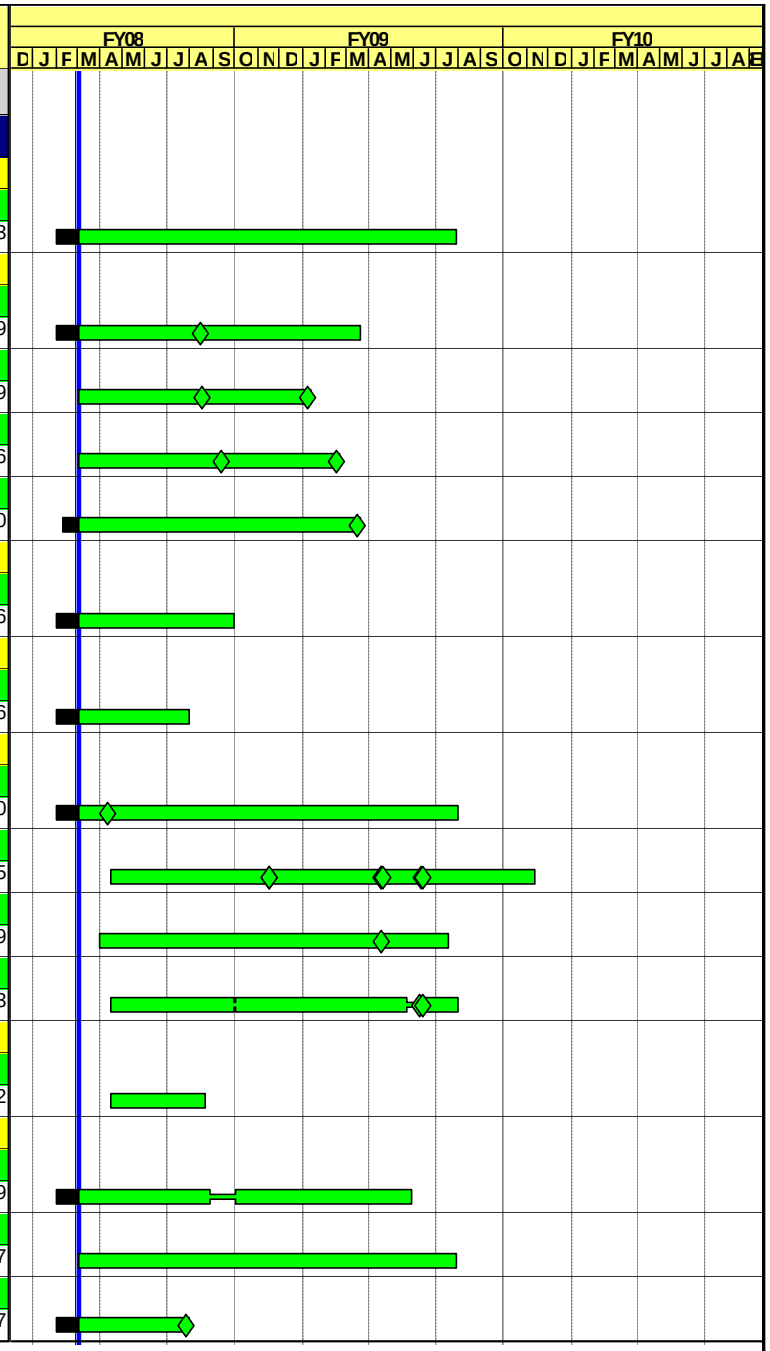
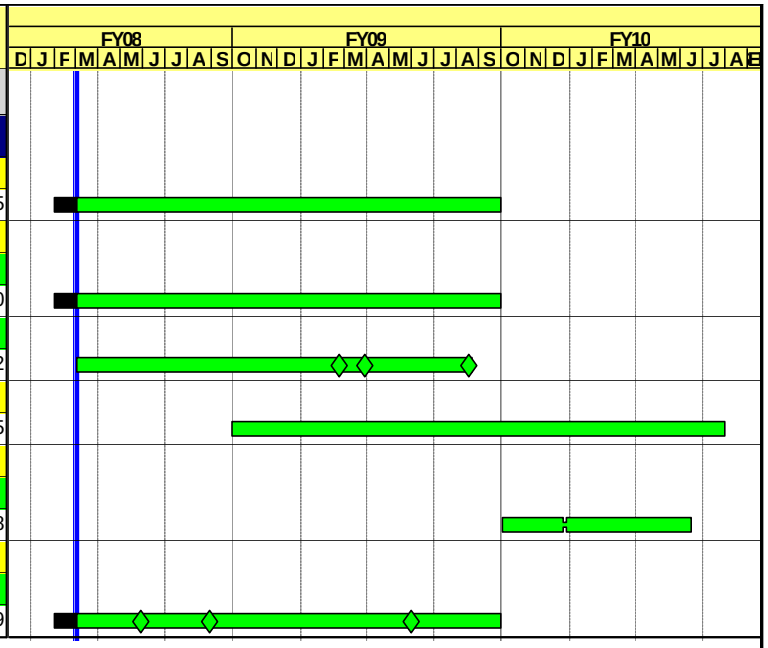
Activity ID	Activity Description	Early Start	Early Finish	Budgeted Cost
2 LCLS PROJECT - R&D, SPARES, COMMISSIONING				
2.06 X-RAY END STATION SYSTEMS (OPC)				
+ 2.06.01 XE System Mgmt & Integration				
		02/01/08A	09/30/09	593,885
2.06.02 Controls Subsystem				
+ 2.06.02.04 LBNL Laser Timing				
		02/01/08A	09/30/09	885,610
+ 2.06.02.08 2-D X-Ray Detector Controls				
		03/03/08	08/21/09	667,492
+ 2.06.03 Commissioning				
		10/01/08	07/30/10	3,435,935
2.06.04 Spares				
+ 2.06.04.01 Spares - PPS Stoppers				
		10/02/09	06/14/10	205,718
2.06.05 X-Ray Detectors				
+ 2.06.05.02 2-D X-Ray Detector				
		02/01/08A	09/30/09	2,054,659
